










INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 7. 8. 2024

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
1	06008		Vzdrževanje objektov v lasti občine	517.800,00	169.684,84	85,41%		
		OB084-20-0043	Vzdrževanje objektov v lasti občine	132.073,00	42.874,04	42,78%	Sklenjena je pogodba za preureditev notranjih prostorov "Nova KBM" s podjetjem Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., zaključek projekta je predviden v prvi polovici novembra 2024, kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v teh letih.	
		OB084-22-0013	Vzdrževanje objekta "Nova KBM"	343.017,00	84.101,70	100,00%		
		OB084-23-0041	Obnova strehe "Mostovna"	42.710,00	42.709,10	100,00%		
2	07054		Kontejnrska mesta in ekološki otoki	140.000,00	47.539,72	80,11%		
		OB084-23-0043	Ekološki otoki	140.000,00	47.539,72	80,11%	Sredstva proračunske postavke so bila v prvi polovici leta porabljena za ureditev EO na Cankarjevi ulici ter EO v Šempasu pri pokopališču. Ocenjujemo, da bodo sredstva na proračunski postavki do konca leta porabljena v celoti. Zaključena je faza ureditve dostopne poti do EO v Solkanu, dela za ureditev EO v Rožni Dolini pri NIJZ so se pričela. V pridobivanju so pogoji za izvedbo ureditve na dveh lokacijah ter dokumentacija za ureditev EO na Rejčevi ulici in na Lokvah. V projektiranju pa sta še dve lokaciji.	
3	07109		Komunalni objekti v KS - pokopališča in poslovilni objekti	210.000,00	127.231,03	90,34%		
		OB084-23-0055	Rekonstrukcija mrliške vežice Branik	200.000,00	127.231,03	94,86%	Zaključuje se rekonstrukcija vežice v Braniku po pogodbi za 1. fazo rekonstrukcije, ki predstavlja rekonstrukcijo vežice v celoti vključno z dostopnim stopniščem in dostopnimi rampami. V okviru razpoložljivih sredstev so naročene tudi nadstrešnice in ureditev pločnika ob objektu. Zunanja ureditev je zaključena tako, da je omogočeno funkcioniranje objekta.	
		OB084-23-0137	Gradnja vežice pri Sv. Trojici v Kromberku	10.000,00	0,00	0,00%	Oddana je bila vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar so bile potrebne dopolnitve in popravki, zaradi česar je prišlo do zamud. Ne glede na navedeno bo takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja opravljen javni razpis za izvedbo. Dela bodo izvedena v okviru razpoložljivih sredstev že v tem proračunskem letu in se zaključijo v letu 2025.	
4	07199		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture-oskrba s toplotno energijo	220.000,00	152.444,87	100,00%		
		OB084-23-0053	Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja	50.000,00	5.770,00	100,00%	Sredstva postavke so bila porabljena za dokončanje obnove toplotne postaje večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gradnikove brigade 31, zaključevanje projekta dograditve vročevoda po Rejčevi ulici ter plačilu stroškov pripravljalnih del na projektu "Priključitev bazena na toplovod".	
		OB084-23-0054	Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju	110.000,00	94.010,17	100,00%	Pri slednjem je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba GOI del je predvidena v jeseni. Ocenjuje se, da bodo do konca leta vsi trije projekti zaključeni, sredstva postavke pa v celoti realizirani.	
		OB084-23-0075	Prikllop Rejčeva	60.000,00	52.664,70	100,00%		
5	07272		Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	393.800,00	330.981,95	94,32%		
		OB084-15-0009	Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča	393.800,00	330.981,95	94,32%	Dokumentacija DGD in PZR za objekt: »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – odvodnik v Sočo« z vsemi pripadajočimi tehničnimi rešitvami (»Zadrževalni Ščedne« z odvodnim kanalom »BCs« itd.) je izdelana. Ima pridobljeni 2 gradbeni dovoljenja. Za tretjo fazo manjka ena parcela. Za četrto fazo čakamo na potrditev pogodb s strani DRSV. Prenos investitorstva na DRSV je v teku. Za prvo fazo je prenos že izveden. Gradnja zaobjema: 1. Izgradnja »odvodnika Soča« po Prvomajski Ulici ; 2. Izgradnja drugega dela »odvodnika Soča« z izpustom v Sočo.; 3. Izgradnja odvodnega kanala »BCs« po Lavričevi ulici; 4. Izgradnja »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami.	
6	07286		Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav	100.000,00	0,00	100,00%		
		OB084-20-0016	Investicijsko vzdrževanje ČN 2020-2024	100.000,00	0,00	100,00%	Investicijsko letno vzdrževanje CČN NOVA GORICA in ostalih ČN znotraj MONG (VIK).	
7	07301		Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	132.640,00	132.639,25	100,00%		
		OB084-17-0009	Vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice	132.640,00	132.639,25	100,00%	Projekt "vzpostavljane povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice" je bil v prvi polovici leta zaključen, s čimer so bili doseženi cilji in kazalniki projekta. V okviru projekta je bilo tako uspešno zaključenih 6 kolesarskih povezav (odsek A: Rejčeva ulica, odsek B: Delpinova ulica, odsek C: Vojkova ulica, Ul. XXX. Divizije, odsek E: Cankarjeva ulica, odsek F: Južna kolesarska pot ter odsek G: podaljšek Delpinove ulice in Trubarjeva ulica), v skupni dolžini 4.014,4 m, povprečne širine 1,38 m (posamezni odseki so bili različnih širin, od 1,2 m do 3,0 m glede na vrsto kolesarske povezave), od tega kar 2.767,3 m kolesarske povezave, ki je od vozišča ločeno z zelenico in/ali drevoredom. Ob kolesarskih povezavah je bilo izvedeno tudi 3.956,7 m površin za pešce (pločnikov), povprečne širine 1,82 m (posamezni odseki so bili različnih širin, od 1,5 m do 2,4 m). Na odseku Delpinove ulice pa je bil urejen skupen prometni prostor površine 3.775 m ² , kjer je bilo postavljenih tudi 15 stojal za kolesa. Sama izvedba del (gradnje) je potekala od februarja 2021 pa do konca februarja 2024. Za spremljanje kolesarjev se je na Cankarjevi ulici postavilo tudi števce za kolesa. Skladno s cilji projekta se je v letu 2021 uredilo tudi mobilnostni center in nabavilo opremo za njegovo delovanje ter leta 2021 otvorilo Center trajnostne mobilnosti (CTM). CTM je prevzel v upravljanje Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki skrbi za izvajanje programa trajnostne mobilnosti. V sodelovanju z zaposlenimi na projektu (3 osebe) pri MO Nova Gorica se je za čas trajanja projekta organiziralo ustrezno promocijo trajnostne mobilnosti ter izvajalo letni program Teden trajnostne mobilnosti. Poleg javnega zavoda je za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti skrbela tudi MO Nova Gorica z objavo različnih člankov v lokalnih časopisih, z objavami na lastni spletni strani, na družbenih omrežjih ipd. Investicijski stroški projekta so tako znašali 5.130.790,85 EUR (v IS e-MA kjer smo vključili tudi DDV po 76.a členu 5.214.938,43 EUR), upravičeni stroški so znašali 2.431.922,16 EUR, sofinancirani upravičeni stroški pa 1.932.478,85 EUR.	

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
8	07317		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	1.553.234,00	1.553.233,94	100,00%		
		OB084-18-0044	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Aglomeracija Kromberk	1.553.234,00	1.553.233,94	100,00%	V okviru tega projekta je bila zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanje in čiščenja odpadnih voda RS se bodo realizirali v aglomeraciji ID Kromberk, ki bo priključena na ustrezno čiščenje na CCN Nova Gorica. Na 12ih odsekih je bil zgrajena fekalna kanalizacije v skupni dolžini cca 4.642 m s 6 črpališči in sanacijo vodovoda v skupni dolžini cca 1km+ zaradi gradnje fekalne kanalizacije ter izgradnje meteorne kanalizacije v skupni dolžini cca 1km. Izvedbeno so projekti zaključeni, potrebna so še samo manjša zaključna dela. Pridobljenih je 9 od 13ih uporabnih dovoljenj.	
9	07339		Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	165.000,00	0,00	14,17%		
		OB084-19-0042	Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku	165.000,00	0,00	14,17%	Izvedba vzdrževalnih del v javno korist za ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku po posameznih odsekih z namenom zagotovitve poplavalne varnosti območja pri visokih vodah. Območje obdelave zajema strugo potoka Potok od naselja Potok pri Dornberku do vtoka v Vipavo. Izdelan je IZN (ni potrebno GD). Izdelana je tudi HMS, ki je še v recenziji na DRSV-ju. Parcele so v večini pridobljene, manjkajoče se še ureja.	
10	07346		Regulacija potoka Liskur	109.074,00	0,00	88,26%		
		OB084-20-0033	Regulacija potoka Liskur	109.074,00	0,00	88,26%	Projektna dokumentacija je pripravljena do nivoja DGD, vendar je za nadaljevanje aktivnosti potrebno izpeljati postopke sprememb in dopolnitev OPN (SD 7). Pridobitev gradbenega dovoljenja je pogojena s spremembo namenske rabe predvidene lokacije zadrževalnika, ki se jo ureja s predlaganimi spremembami občinskega prostorskega načrta. Po sprejetju novega prostorskega akta bo oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto ter izdelana PZI projektna dokumentacija.	
11	07366		Vodovod Mestna občina Nova Gorica	503.718,00	19.959,78	99,80%		
		OB084-23-0020	KS Čepovan - javni vodovod	19.600,00	0,00	99,64%	V okviru letne pogodbe je bil zgrajen javni vodovod na območju Breg - Kromberk. V Fazi 1 je izveden cevovod V-1 (L = 404,94 m, NL DN 80 mm) in cevovod Prevezava (L = 11,68 m, NL DN 80 mm), ki se navežeta na obstoječi cevovod. Na stičišču obeh cevovodov je na koti 245 m n.m. narejen nov Redukcijski jašek 1, v katerem je na V- 1 izdelana redukcija tlaka iz 6,3 bara na 1,5 bara (po izvedbi veje V- 3 in Redukcijskega jaška 2, bo vstopni tlak znašal 4,5 bara).	
		OB084-23-0022	KS Kromberk - Loke - javni vodovod	86.418,00	19.959,78	98,81%	Na cevovod »Prevezava« se je prevezal en vodovodni priključek. V Fazi 2 je izvedena gradnja cevovoda V-2 (L = 212,52 m, PE Ø 50 mm), ki se v Reducimem jašku 1 priključi na cevovod Prevezava in se tako naveže na obstoječi cevovod. V jašku je na V-2 je izvedena redukcija tlaka iz 6,3 bara na 3,1 bara (po izvedbi veje V-3 in Redukcijskega jaška 2, bo vstopni tlak znašal 4,5 bara). V najnižji točki cevovoda je predvidena vgradnja enega podtalnega hidranta (DN 50 mm). Na cevovod V-2 se je prevezalo 5 vodovodnih priključkov za 6 objektov. V Fazi 3 je izvedena gradnja povezovalnega cevovoda V-3 (L=282,98 m, NL DN100 mm), ki se je navezal na obstoječi cevovod, ki poteka med vodohranom Breg in cevovodom v smeri predvidenega Redukcijskega jaška 2, ter obstoječi cevovod med vodohranom Damber III in vodohranom Damber II. Na obstoječem cevovodu v naselju Breg se je na koti 269 m n.m izvedel nov Redukcijski jašek 2, v katerem je predvidena redukcija tlaka iz 5,6 bara na 2,1 bara. V OŠ Čepovanu se je izvedel priključek za OŠ. V Novi Gorici se je izdelalo več manjših odsekov vodovoda v sklopu projekta FK Aglomeracija 1515 vključno z daljšo novo linijo na Kolodvorski 750 m in na ulici Barje. V Oseku pri pokopališču poteka večja sanacija vodovoda - potrebna še zaključna dela (asfaltacija). Za ravnico se izdeluje projektna dokumentacija. Za Ozeljan Šmihel se bo izdelal nov odsek JV 47,46,48 in pa dokumentacija za povezavo MIP - tri hiše.	
		OB084-23-0032	KS Nova Gorica - javni vodovod	253.700,00	0,00	100,00%		
		OB084-23-0062	KS Osek-Vitovlje - javni vodovod	63.000,00	0,00	100,00%		
		OB084-23-0063	KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod	50.000,00	0,00	100,00%		
		OB084-23-0065	KS Ravnica - javni vodovod	10.000,00	0,00	99,70%		
		OB084-23-0069	KS Šempas - javni vodovod	21.000,00	0,00	100,00%		
12	07367		Fekalna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica	940.958,00	114.205,47	72,77%		
		OB084-23-0015	KS Branik - javna kanalizacija	6.000,00	0,00	100,00%	Nova Gorica zaobjema izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja ločenega tipa na območju Rafuta - Kostanjeviška cesta. Fekalno kanalizacijo, katero se v celoti zgradi na novo, se bo navezalo na obstoječo kanalizacijo naselja Rožna Dolina v bližini objekta s hišno številko "Kostanjeviška cesta 18". Projektirana fekalna kanalizacija je gravitacijska.	
		OB084-23-0018	KS Gradišče nad Prvačino - javna kanalizacija	300.000,00	1.218,11	1,20%	Fekalno kanalizacijo sestavljajo naslednji fekalni kanali: - fekalni kanal FK1, dimenzije DN250 in dolžine 596,3 m - fekalni kanal FK1.1, dimenzije DN200 in dolžine 18,5 m	
		OB084-23-0024	KS Nova Gorica - javna kanalizacija	599.026,00	108.256,20	100,00%	Zaradi nestabilnega terena in zagotovitve kontinuiranega odvajanja podzemne vode se na nekaterih odsekih izvede drenažno kanalizacijo. Skupna dolžina drenažne kanalizacije je 596,3 m. Drenažni kanali se izvedejo z DK PE cevmi klase SN8 in dimenzije DN160. Projekt vključuje tudi nov NN vod. JN za izvjalca je ravno v teku. Izvedena kanalizacija v Žabjem Kraju, na Prvomajski - Blanče - mešana, naročena je dokumentacija: Branik Korp - novelacija dokumentacije	
		OB084-23-0026	KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija	24.732,00	4.731,16	100,00%	PD - Kanalizacija in vodovod Grčna od 17 do 31 - Hydrotech PD - Kanalizacija in vodovod Grčna od 42 do 52 - Hidrolab PD - Kanalizacija in vodovod Podgrčna od 43 do 44 - Hidrolab	
		OB084-23-0030	KS Solkan - javna kanalizacija	10.000,00	0,00	100,00%	PD DGD - MIP - Krožišče PD DGD - Krožišče - Tri hiše	
		OB084-23-0031	KS Šempas - javna kanalizacija	1.200,00	0,00	96,43%	Operativni program odvajanja PD DGD - aglomeracija Ozeljan PD DGD - aglomeracija Šempas PD DGD - aglomeracija Vitovlje	



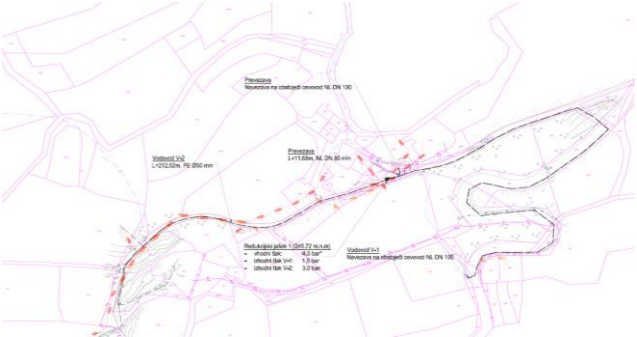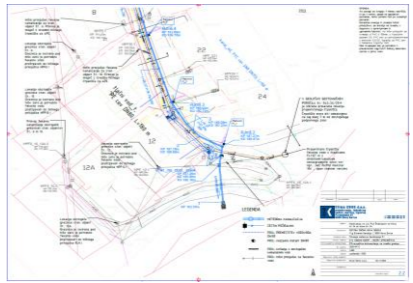



INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 7. 8. 2024

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
13	07368		Meteorna kanalizacija Mestna občina Nova Gorica	365.500,00	74.973,83	99,75%		
		OB084-23-0015	KS Branik - javna kanalizacija	28.000,00	845,63	74,45%	Izvedeni odseki kanalizacije na območju MONG-a: - MK Preserje, - MK Erjavčeva, - MK Pod Frato Prvačina, - MK Pod Škabrijelom, - MK Vojkova, - MK krajši odsek Stara Gora - Liskur.	
		OB084-23-0024	KS Nova Gorica - javna kanalizacija	200.800,00	845,63	100,00%		
		OB084-23-0027	KS Prvačina- javna kanalizacija	136.700,00	73.282,57	99,41%		
14	07370		Trajnostno urejanje prometa	155.000,00	1.365,49	30,51%		
		OB084-23-0034	Trajnostno urejanje prometa	155.000,00	1.365,49	30,51%	V okviru proračunske so bili delno kriti stroški vzdrževanja opozorilnih tabel "Vi vozite". Naročena in v izdelavi je projektna dokumentacija za ureditev avtobusnih postajališč, pločnikov ter prehoda za pešce v Braniku, izdelava projektna dokumentacije za ureditev varnih dostopov do parka Rafut na Kostanjeviški cesti ter izdelava idejne zasnove za preusmeritev državne ceste na Lokvah. Iz sredstev na postavki se krije tudi del stroškov, ki bodo nastali v okviru aktivnosti, ki se bodo odvijale ob Evropskem tednu mobilnosti. Predvideva se začetek izdelave novelacije občinske celostne prometne strategije, ki bo zaključena v l. 2025. Prav tako je v pripravi naročilo projektna dokumentacije za ureditev postajališč za avtobuse in ureditev križišča za Banjšice v Grgarju, ter naročilo projektna dokumentacije za prometno ureditev na Gradišču.	
15	07374		Izvajanje parkirne politike	135.932,00	14.640,00	49,09%		
		OB084-23-0083	Izvajanje parkirne politike	123.732,00	14.640,00	53,93%	Za uvedbo parkirne politike je potrebno predhodno vzpostaviti ustrezno stanje razpoložljivih parkirnišč. V ta namen je izveden pregled stanja garažnih hiš v Novi Gorici in priprava usmeritev za njihovo fazno prenovu. Izdelana je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in za samo izvedbo za začasna parkirnišča na Ulici Gradnikove brigade. Hkrati poteka priprava odloka in vseh ostalih dokumentov, ki so potrebni za uvedbo nove parkirne politike v MONG. Aktivnosti potekajo v skladu s planom.	
		OB084-24-0024	Ukrepi parkirne politike	12.200,00	0,00	0,00%	V okviru postavke "Ukrepi parkirne politik" je načrtovana priprava projektna dokumentacije za prijavo na razpis "Ukrepi trajnostne mobilnosti" MOPE za nabavo prevoznega sredstva za nadzor mirujočega prometa in izdelavo spletne platforme multimodalne mobilnosti. Postavka bo v letošnjem letu porabljena v okviru načrtovanih sredstev. Planirane aktivnosti so v skladu z uvedbo nove parkirne politike v MONG.	
16	07377		Rekonstrukcija cestnega omrežja	424.200,00	118.444,11	71,22%		
		OB084-23-0144	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	424.200,00	118.444,11	71,22%	Izvedeno je bilo: - dokončanje ureditve križišča meja SLO/ITA v Solkanu - ureditev pločnika Delpinova ulica OŠ Fran Erjavec - izdelava varnostnega načrta in koordinacija pri ureditvi povezovalnega pločnika, meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave ob kategorizirani občinski cesti v Prvačini - izvajanje koordinacije VZD na objektu Ureditev pločnika v Prvačini - izvedba asfaltacije JP 502371 Ajdovščina - Mravljevi	
17	07382		Postavitev sončnih elektrarn konzorcij MONG	504.248,00	49.715,12	9,86%		
		OB084-24-0009	Postavitev sončne elektrarne na objektu Stadion Nova Gorica	6.954,00	5.352,76	76,97%	Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija za postavitve sončnih elektrarn. Pridobljena so bila vsa potrebna soglasja. Oddana je bila vloga na javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkirniščih za obdobje 2024 do 2026. V izvedbi je javno naročilo za izbiro izvajalcev za postavitve sončnih elektrarn - i. faza. V katerem je predvidena postavitve sončnih elektrarn na strehe objektov - OŠ Čepovan, Telovadnica Prvačina, Vrtec Dornberk, POŠ Prvačina, Vrtec Čriček in Vrtec Kekec. Izvedba ostalih sončnih elektrarn je predvidena v naslednjem letu.	
		OB084-24-0010	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Čepovan	80.105,00	3.705,76	4,63%		
		OB084-24-0011	Postavitev sončne elektrarne na objektu Telovadnica Prvačina	89.800,00	4.254,76	4,74%		
		OB084-24-0012	Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Dornberk	51.571,00	3.522,76	6,83%		
		OB084-24-0013	Postavitev sončne elektrarne na objektu Glasbena šola Nova Gorica	93.339,00	3.400,76	3,64%		
		OB084-24-0014	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Branik	6.954,00	4.986,76	71,71%		
		OB084-24-0015	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Solkan	6.954,00	4.498,76	64,69%		
		OB084-24-0016	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Šempas	6.954,00	4.254,76	61,18%		
		OB084-24-0017	Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Frana Erjavca	6.954,00	5.352,76	76,97%		
		OB084-24-0018	Postavitev sončne elektrarne na objektu POŠ Prvačina	50.514,00	3.400,76	6,73%		
		OB084-24-0019	Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Čriček	52.671,00	3.461,76	6,57%		
		OB084-24-0020	Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Kekec	51.478,00	3.522,76	6,84%		
18	08027		Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	257.320,00	28.288,00	56,74%		
		OB084-23-0033	Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija	69.320,00	960,00	94,57%	Izdelana je bila Strokovna podlaga za ureditev poslovne cone Science city Solkan. Izdelana je bila prva faza Demografske študije.	
		OB084-23-0143	Strokovne podlage za športni park Ajševica	40.000,00	0,00	0,00%	V izdelavi so Izhodišča za pripravo nove generacije prostorskih aktov, Analiza ključnih gospodarskih sektorjev MONG in Analiza gospodarskega podpomenega okolja v MONG.	
		OB084-23-0152	Science city Solkan	28.000,00	27.328,00	97,60%	V izdelavi je zazidalni preizkus in projektna naloga za arhitekturni natečaj za območje OPPN Ob Sodišču, Kare A.	
		OB084-23-0153	OPPN poslovna cona Meblo	50.000,00	0,00	0,00%	V izdelavi je hidrološko – hidravlična študija za OPPN Prvačina.	
		OB084-23-0154	Nova generacija prostorskih aktov	50.000,00	0,00	0,00%	V izvedbi je javno naročilo za izbiro izvajalca za izdelavo OPPN Poslovna cona Meblo.	
		OB084-24-0005	Spremembe in dopolnitve OPN 9	20.000,00	0,00	27,66%	V pripravi je javno naročilo za spremembe in dopolnitve OPN 09.	
							V pripravi je projektna naloga za pripravo javnega naročila za izdelavo strokovnih podlag za Športni park Ajševica.	
19	08029		Projekt Grennat	121.448,00	8.305,79	40,41%		
		OB084-23-0084	GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj	121.448,00	8.305,79	40,41%	V avgustu je bila podpisana pogodba z izvajalcem GOI del na gradu Rihemberk, z namenom izboljšanja ohranitvenega stanja netopirjev z vzporednim izboljšanjem stanja kulturnega spomenika Grad Rihemberk (EŠD 40). Skladno s pogodbo se izvajalec obvezuje pogodbeno dela izvesti do novembra 2024. Do konca leta bo izvedena še delavnica na temo zelene infrastrukture ter naročena projektna dokumentacija za zazelenitev območja ob Soči in trajnostni dostop do zaščitenih območij ob Lijaku.	



INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 7. 8. 2024

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
20	08031		Projekt GreenInCities	102.531,00	13.013,06	12,94%		
		OB084-23-0105	Projekt GreenInCities	102.531,00	13.013,06	12,94%	Projekt v prvem letu izvajanja predvideva pripravo projektne dokumentacije za vodni teater ob potoku Koren. S pripravo projektne dokumentacije bomo pričeli v jesenskem času.	
21	09076		Sredstva iz koncesnine državnih gozdov	405.000,00	252.900,19	63,64%		
		OB084-23-0103	Investicijsko vzdrževanje gozdnih in občinskih cest 2024-2028	405.000,00	252.900,19	63,64%	Izvedena je bila preplastitev LC 284012 Bate - Lohke - Podlešče od stacionaže 2660m do stacionaže 3900m. Dela na omenjeni cesti so bila izvedena v koncu leta 2023.	
22	09082		Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	495.654,00	465.763,23	93,97%		
		OB084-18-0029	Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk	495.654,00	465.763,23	93,97%	Gradnja infrastrukture na območju PEC Nova Gorica - Kromberk je zaključena. V začetku leta je bila pridobljena sprememba gradbenega dovoljenja, sredstva pa so bila porabljena za dokončanje gradbenih del. Izdelana je bila projektna dokumentacija izvedenih del ter pridobljeno uporabno dovoljenje. V teku je izvedba drugega javnega poziva za prodajo zemljišč na območju urejanja, kjer se bodo prodajale še preostale parcele.	
23	09097		Zeleni vstopni center Lijak	401.500,00	31.396,70	18,15%		
		OB084-23-0072	Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak	401.500,00	31.396,70	18,15%	Izdelana je bila projektna dokumentacija (DGD in PZI) za gradnjo objekta. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v aprilu 2024. Dodatno se izdeluje projektna dokumentacija za vodovod. Izvajalec gradnje še ni izbran.	
24	09098		Projekt MEDS GARDEN+	113.815,00	2.200,18	6,47%		
		OB084-23-0088	Projekt MEDS GARDEN+	113.815,00	2.200,18	6,47%	Izvedene so bile skupne partnerske aktivnosti. V pripravi je evidenčni postopek za zbiranje ponudb za pripravo zasnove ureditve vaškega jedra srednjega Lokovca in izvedbeni načrt za ureditev gozdnega vrta, info točke v Spodnjem in Zgornjem Lokovcu. Predviden je začetek urejanja gozdnega vrta - zasaditve in ureditve opreme.	
25	09100		Participativni proračun v obdobju 2024 - 2026	100.000,00	0,00	10,04%		
				12.000,00	0,00	83,65%		
		OB084-24-0049	Participativni proračun - Hišica v Panovcu (območje 1)	20.000,00	0,00	0,00%	Usklajevanje o potrebnih delih pri obnovi hišice v Panovcu.	
		OB084-24-0050	Participativni proračun - Ureditev kontejnerskega mesta ob bivši trgovini v Čepovanu (območje 2)	15.000,00	0,00	0,00%	Izvedba kontejnerskega mesta se prestavi na leto 2025 zaradi nakupa parcele in posledično rušitve objekta stare trgovine.	
		OB084-24-0051	Participativni proračun - Obnova korit iz 1. svetovne vojne in letni teater na prostem (območje 3)	16.000,00	0,00	0,00%	Usklajevanje s predlagateljem projekta in priprava na izvajanje.	
		OB084-24-0052	Participativni proračun - Ureditev parka in okolice Kulturnega doma Branik (območje 4)	17.000,00	0,00	0,00%	Dogovarjanje in usklajevanje s krajevno skupnostjo ter hortikulturno komisijo o možnih predlogih in rešitvah za izvedbo obnove parka in zelenice.	
		OB084-24-0053	Participativni proračun - Ureditev okolice športnega igrišča v Vitovljah in nab.opreme (območje 5)	20.000,00	0,00	0,00%	Projekt je v začetni fazi izvajanja. V okviru predvidenega je vzpostavljen kontakt s predlagateljem projekta, dogovorjen ogled lokacije za ureditev, sledi izvedba. V letu 2024 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi.	
26	10052		Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	645.310,00	39.379,98	49,88%		
		OB084-23-0135	Investicijsko vzdrževanje objektov v Javnem zavodu za šport	15.000,00	0,00	100,00%	Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena za: - ureditev športnega igrišča v Braniku, - zamenjavo umetne trave v Športnem parku Nova Gorica, - za nabavo osnovnih sredstev Javnega zavoda za šport Nova Gorica.	
		OB084-23-0136	Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču	250.300,00	0,00	98,09%	V športnem parku se dela za zamenjavo umetne trave na nogometnem igrišču zaključujejo. Odstranjena je bila stara umetna trava, sanirana je bila poškodovana podlaga, dobavljena in nameščena je nova umetna trava. Ob tem bodo nabavljeni še novi goli, saj so stari bili dotrajani.	
		OB084-23-0140	Ureditev športnega igrišča Branik	380.010,00	39.379,98	16,15%	Sredstva proračunske postavke so v letošnjem letu bila porabljena za plačilo odškodnine bonitete zemljišča v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za ureditev šolskih poti ter športnega igrišča v Braniku. Projekt je prijavljen na razpis za sofinanciranje na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport., izvedba pa je odvisna od rezultatov razpisa. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, v izdelavi je PZI projektna dokumentacija.	
27	10152		Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica	9.226.517,00	3.759.604,79	76,07%		
		OB084-20-0003	Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3	9.226.517,00	3.759.604,79	76,07%	Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za plačilo izvajalca gradbenih del, gradbeni nadzor, projektantski nadzor, za koordinatorja varnosti pri delu, najem nadomestnih parkirnišč ter plačilo zamudnih obresti pri korekciji stopnje DDV. Izvajalec je podal prošnjo za podaljšanje roka izvedbe zaradi višje sile (poplave 2023), ki je sedaj podaljšan do 24.11.2024. Dela tečejo skladno z novim terminskim planom in predvideva se, da bodo le-ta zaključena do konca septembra 2024. Sledil bo pregled objekta, odprava pomanjkljivosti in napak, izdelava PID projektna dokumentacije, izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. V teku je proces izbire dobavitelja opreme, ki bo izbran predvidoma konec avgusta 2024. Načrtuje se in vse dela na tem, da bo objekt do konca leta 2024 predan v uporabo.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 7. 8. 2024

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
28	10205	URBINAT	URBINAT	103.431,00	70.707,55	89,94%		
		OB084-18-0038	URBINAT	103.431,00	70.707,55	89,94%	Izdelana je bila projektna dokumentacija (DPP) za most na Ulici Šantlovih in za vodni teater. V pripravi je projektna dokumentacija DGD za most na Ulici Šantlovih ter elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo za parcele 1316, 1315/3, 1315/4, 1315/1, 1314/2 in 1314/1 – del, vse k. o. Nova Gorica. Izdelana je bila Hidrološka Hidravlična študija za potok Koren, ki gre septembra v recenzijo. V sklopu vzpostavitve tematske učne poti so bile ob potoku Koren postavljene 3 informativne table z namenom izobraževanja obiskovalcev območja glede biodiverzitete.	
29	10219	Sanacija letnega bazena	Sanacija letnega bazena	570.414,00	0,00	0,00%		
		OB084-19-0017	Sanacija letnega bazena	570.414,00	0,00	0,00%	Oddana je bila vloga za pridobitev sofinanciranja za predviden objekt in pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo del. Če bodo uspešno pridobljena sredstva, je predvidena izvedba del na tem objektu v jeseni 2024, do poletja 2025.	
30	10254	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	157.408,00	0,00	100,00%		
		OB084-21-0004	Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija	157.408,00	0,00	100,00%	Sanacijska dela na Športni dvorani v Novi Gorici na osnovi unovčenja bančne garancije naj bi bila izvedena do septembra 2024, kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v tem letu.	
31	10263	EPK GOI2025 - infrastruktura	EPK GOI2025 - infrastruktura	5.131.247,00	211.372,21	42,48%		
		OB084-22-0006	EPK GOI2025 - Revitalizacija Trga Evrope	1.587.789,00	1.098,00	3,12%	EPK GOI2025 - Revitalizacija Trga Evrope: Trenutno se betonira povozno ploščo pred Železniško postajo, iz italijanske strani se je začelo tlakovati površine, ki zajemajo projekt Trga Evrope. Projekt poteka v skladu s planom.	
		OB084-23-0077	EPK GOI2025 - Vzpostavitev podpome infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z Laščakovo vilo	176.165,00	2.924,80	1,66%	EPK GOI2025 - Vzpostavitev podpome infrastrukture za prog. razvoj Rafutskega paka z Laščakovo vilo: Projekt je v pripravljani fazi. V letu 2024 je predvidna izdelava projektne in ostale dokumentacije ter prijava projekta na koriščenje sredstev iz mehanizma CTN, PN 9 "Trajnostni razvoj lokalnih območij", SC RSO 5.1 "Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)" Izvedba je v skladu s planiranim.	
		OB084-23-0078	EPK GOI2025 - EPIC	1.462.054,00	151.926,05	98,87%	EPK GOI2025 - EPIC, pridobilo se je gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec GITRI d.o.o., ki je z deli pričel v juliju 2024, zaključek del je predviden v aprilu 2025, kar je v skladu s predvideno porabo proračunskih sredstev v letih 2024 in 2025. Na objektu se izvajajo rušitvena dela strehe, notranjih sten,...skladno s projektom za izvedbo del.	
		OB084-23-0079	EPK GOI2025 - SUPER 8	752.686,00	21.590,80	78,02%	EPK GOI2025 - SUPER 8, pridobilo se je gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec Komunala Sežana d.d., ki je z deli pričel v juliju 2024, zaključek del je predviden v decembru 2024, kar je v skladu s predvideno porabo proračunskih sredstev. Na objektu se izvajajo rušitvena dela, notranjih sten, oken, vrat in zunanje ureditve, skladno s projektom za izvedbo del.	
		OB084-23-0080	EPK GOI2025 - Kolesarska in peš povezava v okviru nadgradnje ŽPI ŽP Nova Gorica	804.031,00	0,00	100,00%	EPK GOI2025 - Kolesarska in peš povezava v okviru nadgradnje ŽPI ŽP Nova Gorica: z DRSI je sklenjen dogovor o vložku MONG za urejanje kolesarske povezave, ki se bo uredila v sklopu investicije izdelave podhoda pod železniško progo, ki jo pelje država. Sredstva bodo plačana po izdaji zahtevka s strani DRSI	
		OB084-23-0081	EPK GOI2025 - Urbani zeleni pas	60.720,00	2.989,00	4,92%	EPK GOI2025 - Urbani zeleni pas: Projekt je v pripravljani fazi. Aktivnosti potekajo skladno s predvidenim časovnim načrtom. V drugi polovici leta 2024 je predvidena izdelava izvedbene dokumentacije za ureditev Urbanega zelenega pasu. V letu 2025 je predvidena prijava projekta na koriščenje sredstev iz mehanizma CTN, PN 3 "Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost", SC RSO 2.7 "Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)" ter izvedba JN za izbor izvajalca del. Izvedba Urbanega zelenega pasu je predvidena v letu 2026 in 2027.	
		OB084-23-0096	EPK GOI2025 - Igrišča na meji	117.706,00	0,00	0,00%	EPK GOI2025 – Igrišča na meji: V teku je izdelava idejne zasnove športnega igrišča na meji. V drugi polovici leta 2024 je predvidena izdelava izvedbene dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za ureditev/postavitve javnih športno/rekreacijskih igrišč.	
		OB084-23-0097	EPK GOI2025 - Trg Evrope - Lott 2	170.096,00	30.843,56	34,25%	EPK GOI2025 – Trg Evrope, Lott 2: Projekt je v fazi izvajanja. MO Nova Gorica je v prvi polovici leta 2024 pričela z ureditvijo meteorne odvodnje območja med Železniško postajo Nova Gorica in Erjavčevo ulico, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2024. Ureditev parkovnih in drugih površin na obravnavanem območju pa vodi kot edini pooblaščenec EZTS GO. Prenova je v zaključni fazi projektiranja.	

INVESTICIJE S PLANIRANO VREDNOSTJO V VELJAVNEM PRORAČUNU NAD 100.000 EUR V OBDOBJU OD 1. 1. 2024 DO 7. 8. 2024

Zap. št.	PP	NRP	Naziv proračunske postavke Naziv načrta razvojnih programov	Veljavni proračun na dan 7.8.2024	Realizacija na dan 7.8.2024	% realizacije s predobremenitvami in prevzetimi obveznostmi	Opis stanja	Renderji, logotipi, fotografije
32	10265		Rekonstrukcija telovadnice, atrijev in zunanje igrišča na OŠ Kozara	366.190,00	366.180,32	100,00%		
		OB084-22-0012	Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanje igrišča na OŠ Kozara	366.190,00	366.180,32	100,00%	Objekt je končan. Dela so prevzeta, potrjen končni obračun, sofinancerska sredstva so koriščena.	
33	10267		Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca	162.260,00	0,00	100,00%		
		OB084-23-0008	Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage	162.260,00	0,00	100,00%	Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Izdelan je bil osnutek urbanistične zasnove celotnega območja NG-036 ter DPP za osnovno šolo Frana Erjavca. Oddane so bile vloge za pridobitev projektnih pogojev. Po pridobitvi le-teh, bo sledila izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, ki bo predvidoma izdelana v septembru 2024. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bo oddana do konca letošnjega leta. Sledi pridobivanje gradbenega dovoljenja ter izdelava projekta za izvedbo (PZI). Sama izvedba bi ob pridobitvi sredstev bila mogoča s koncem šolskega leta (junij 2026). Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja po potrebno izvesti Lokacijsko preveritev, saj podrobni projektni pogoji (PIP) trenutno omejujejo kakršnokoli gradnjo, rekonstrukcijo, dozidavo na tem območju. Lokacijska preveritev je tudi predmet pogodbe z izbrani projektantom.	
34	10271		Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	694.500,00	133.592,18	96,54%		
		OB084-23-0037	Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza	694.500,00	133.592,18	96,54%	Za izvedbo je bil izbran izvajalec ETG EDITREND Trgovina in gradbeništvo d.o.o. Uvedba v delo je bila v novembru 2023, predviden zaključek del v avgustu 2024, rok se zamika za dva meseca zaradi zahteve za ureditev požarne varnosti za celoten objekt (za pridobitev uporabnega dovoljenja) kar je skladno s predvideno porabo proračunskih sredstev v teh letih.	
35	10272		Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	115.000,00	0,00	64,93%		
		OB084-23-0038	Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan	115.000,00	0,00	64,93%	Izbran je izvajalec Promobile d.o.o., ki je z deli na strehi starega dela pričel v juliju 2024, zaključek del je predviden v novembru 2024, za ostali del je predvidena izbira izdelovalca projektne dokumentacije DGD in PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek del v drugi polovici leta 2025 ter zaključek v letu 2026 kar je v skladu s predvideno porabo proračunskih sredstev.	
36	10275		Projekt SINGERS CORNERS	147.000,00	5.700,00	6,02%		
		OB084-23-0089	Projekt SINGERS CORNERS	147.000,00	5.700,00	6,02%	V sklopu projekta je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca delne prenove Potarjeve hiše. Obnova bo zaključena predvidoma do spomladi leta 2025. V sklopu projekta je predvidena tudi izvedba dogodkov v podporo Evropski prestolnici kulture. Dogodki bodo potekali v letu 2025.	
37	22109		Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Branik	147.179,00	4.903,99	94,80%		
		OB084-23-0111	Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Branik	4.538,00	4.538,00	100,00%	Izvedena bo sanacija strehe na stavbi KS Branik, na naslovu Branik 75, 5295 Branik. Z izbranim izvajalcem SKM TIM d.o.o. je podpisana gradbena pogodba. Dela se bodo predvidoma začela v septembru 2024 in se zaključila do konca novembra 2024. Potrebno je še izbrati nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu.	
		OB084-24-0025	Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Branik 2024 - 2025	1.950,00	0,00	0,00%		
		OB084-24-0026	Nakup opreme KS Branik	1.000,00	365,99	36,60%		
